

# RELATÓRIO DE GESTÃO

JANEIRO 2021



## SUMÁRIO

### **1. Coordenação de Manutenção – CMA/SOMA**

- 1.1 Áreas e campus solicitantes junto à CMA no mês
- 1.2 Principais disciplinas executadas
- 1.3 Demonstrativo de ordens de serviço no mês
- 1.4 Gráficos de ordens de serviço por área
- 1.5 Gráfico de ordem de serviço por disciplinas
- 1.6 Serviços Executados

### **2. Coordenação de Transporte, Segurança e Logística – CTSL/SOMA**

- 2.8 Divisão de Transporte – DTR
  - 2.8.1 Solicitações de Transporte e Logística executadas
  - 2.8.2 Manutenção das viaturas transferidas da Polícia Federal para a UFF
  - 2.8.3 Organização dos veículos inservíveis e sucatas para Leilão
- 2.9 Divisão de Segurança e Logística – DSL
  - 2.9.1 Principais ações
  - 2.9.2 Quantitativo de postos de vigilantes por região
  - 2.9.2 Quantitativo de postos de vigilantes por função
  - 2.9.2 Quantitativo de postos de vigilantes por campi

## 1. Coordenação de Manutenção – CMA/SOMA

### 1.1 Áreas e campus solicitantes junto à CMA no mês

#### 1.1.1 Niterói e Interior

- Campus Gragoatá;
- Campus Praia Vermelha;
- Campus Valonguinho;
- Reitoria;
- Áreas dispersas;
- Interior.


### 1.2 Principais disciplinas executadas

- Hidráulica (Instalação hidráulica das bombas, troca de torneira, troca dos anéis de borracha de pia dentre outros);
- Elétrica (Troca de lâmpadas, troca de interruptor, instalação do quadro com disjuntores dentre outros);
- Auxiliar de Almoxarife (Retirada de materiais inservíveis, apoio em mudanças dentre outros);
- Auxiliar de Jardinagem (Poda de galhos, Roçada dos matos dentre outros);
- Marcenaria (Instalação de porta, Conserto de estrutura de telhado dentre outros);
- Limpeza de Reservatórios D'água (Limpeza dos reservatórios de água);
- Civil (Demolição da casa de bombas, confecção de uma rampa, reparo em paredes dentre outros);
- Extintores (Manutenção preventiva e corretiva de extintores);
- Refrigeração (Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado);
- Pintura (Pintura de parede, pintura do meio fio dentre outros);
- Dedetização/Descupinização (Dedetização, descupinização e monitoramento de pragas);
- Serralheria (Conserto de solda dentre outros);
- Outros (Limpeza de telhado, calhas e descidas d'água dentre outros).


### 1.3 Demonstrativo de ordens de serviço no mês

TOTAL (OS EMITIDAS)	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
304	(Qt)	304	0
	(%)	100%	0%

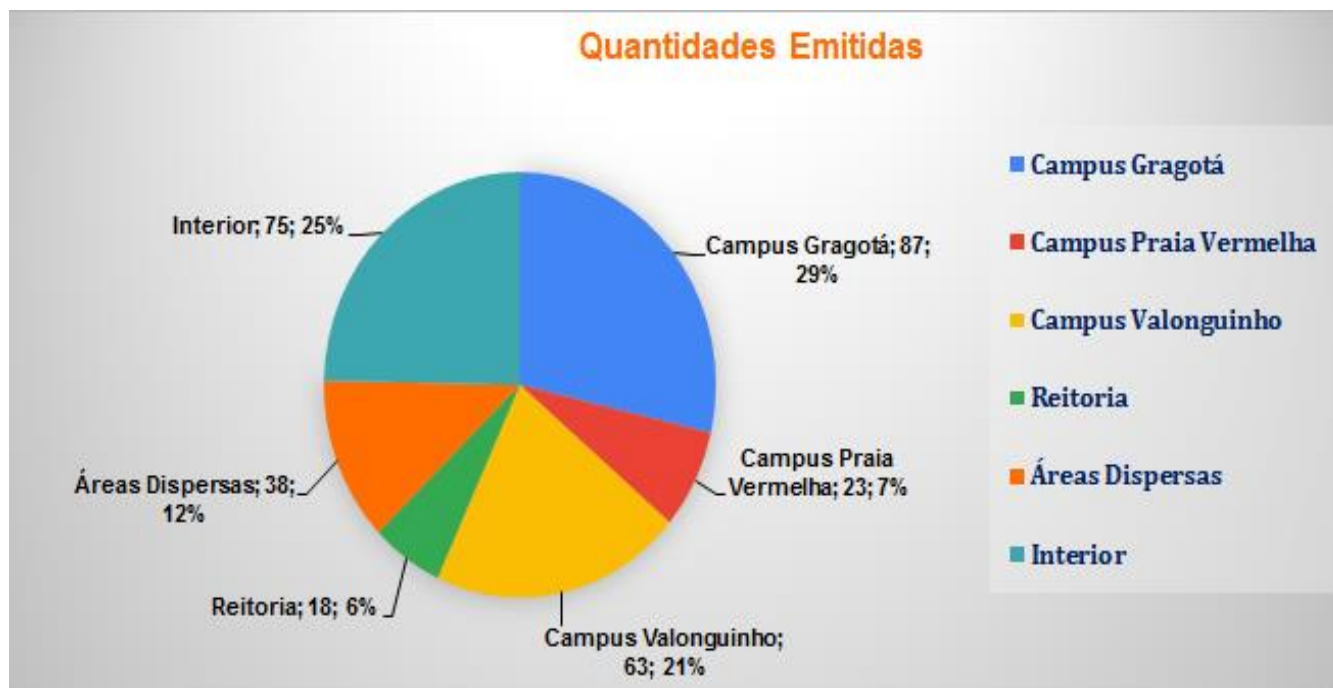


### 1.4 Gráfico de ordens de serviço emitidas por área



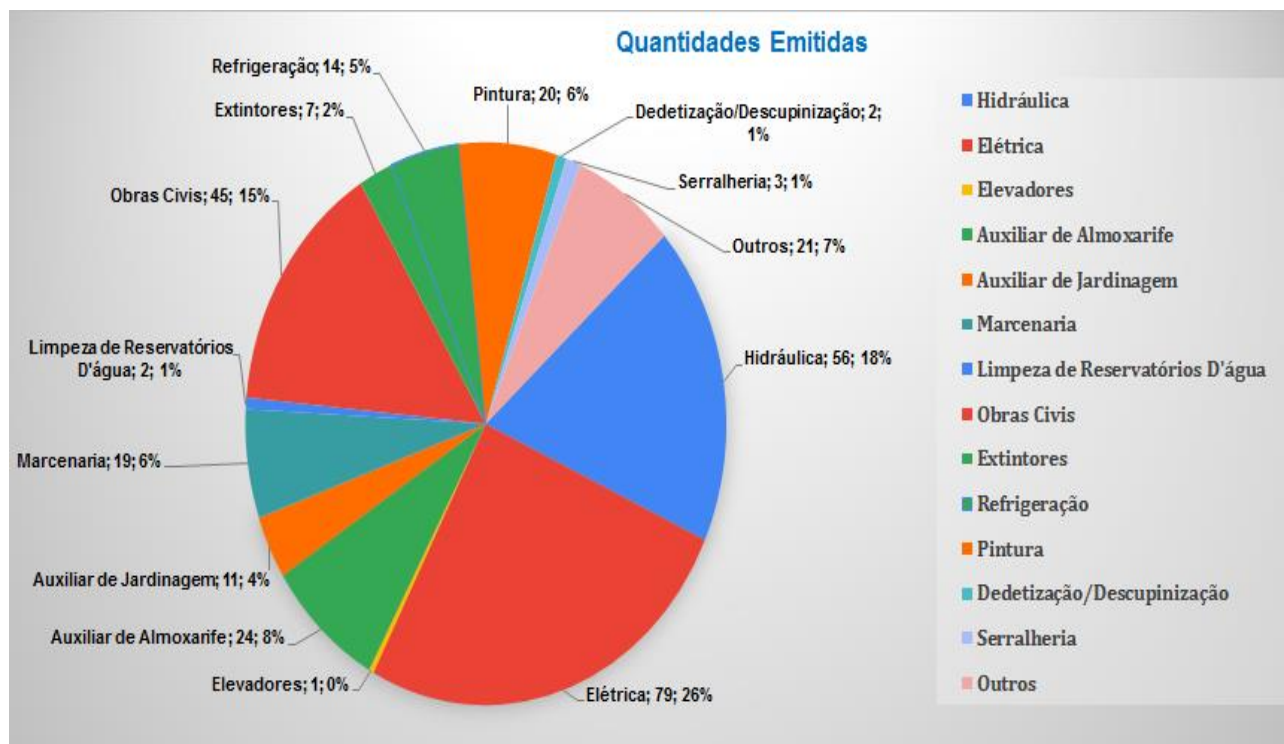


### 1.5 Gráfico de ordens de serviço emitidas por disciplina




## 1.6 Serviços executados

DMBI - SERVIÇOS EXECUTADOS - NITERÓI							
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
1	04/01/2021	Troca de Três lampadas no consultório médico da Reitoria	Elétrica	Reitoria	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Pablo dos Santos
2	04/01/2021	Serviço de Instalação de automático e ramal das bombas em Jurujuba	Hidráulica	Unidades Dispersas	Arquivo		Equipe: Ctesa - Marcelo, com o apoio técnico da SOMA
3	04/01/2021	Serviço de Instalação hidráulica das bombas em Jurujuba	Hidráulica	Unidades Dispersas	Arquivo		Equipe: Ctesa - Renato Dias com o apoio técnico da SOMA
4	04, 05, 06, 07 e 08/01/2021	Pintura da Guarita do Campus do Gragoatá	Pintura	Gragoatá	Guarita		Equipe: Ctesa - Abedias e Reginaldo
5	05/01/2021	Energia restabelecida, troca de um fusível na Casa de Pedra	Elétrica	Valonguinho	VL - Química		Equipe: Ctesa - Pablo Silva com o auxílio do Eng. Eletricista da SOMA/UFF
6	05/01/2021	Limpeza da Calha e Marquise da Faculdade de Farmácia	Outros	Unidades Dispersas	Farmácia		Equipe: Ctesa - Antonio e Nilmar

7	05/01/2021	Obras do Almoarifado do EdUFF	Civil	Mequinho	MQ - Almoarifado EDUFF		Equipe: Empresa Cimina - sob fiscalização da SOMA/UFF
8	05/01/2021	Retirada de um exaotor que pegou fogo no Laboratório	Elétrica	Valunguinho	VL - NAL		Equipe: Ctesa - Renato Dias e Ualece Carvalho
9	05/01/2021	Concretagem e elevação evitando alagamento na base das bombas em Jurujuba	Civil	Unidades Dispersas	Arquivo		Equipe: Ctesa - Marcelo sob fiscalização da DMBI/SOMA
10	06/01/2021	Confecção de um dreno na casa da bomba no SDC - Jujuruja	Hidráulica	Unidades Dispersas	Arquivo		Equipe: Ctesa - Marcelo Lima
11	06/01/2021	Retirada de entulhos da Física Velha	Outros	Valunguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Josino, Salvador e Aldair.
12	06/01/2021	Troca de Lâmpadas na Livraria	Elétrica	Reitoria	RT - EdUFF		Equipe: Ctesa - Oscar e Jorge






13	06/01/2021	Instalação de dois ventiladores de teto no Almojarifado da UFF	Elétrica	Mequinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Oscar e Jorge
14	06/01/2021	Instalação de uma cuba com massa iberê na copa do 3º andar do bl. B	Hidráulica	Gragoatá	GR - Letras		Equipe: Ctesa - Oscar e Jorge
15	06/01/2021	Verificação de tensão e retirada de ar da máquina de ar condicionado da sala 409 do bl. M	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Pablo
16	06/01/2021	Reparo e recolocação em duas fechaduras na sala 307 do bl. M	Marcenaria	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Antonio e Oscar
17	06/01/2021	Conserto de solda do portão com ligação provisória da máquina de solda do Instituto de Educação Física	Serralheria	Gragoatá	GR - Educação Física		Equipe: Ctesa - Helder, Ualace, Oscar, Jorge e Nilmar.
18	06/01/2021	Feito a Base do portão do Instituto de Educação Física	Civil	Gragoatá	GR - Educação Física		Equipe: Ctesa - Nilmar Elias e Oscar Souza





19	07/01/2021	Ajuste de rede elétrica do Nobreak no bl. C	Elétrica	Gragoatá	GR - COSEAC		Equipe: Ctesa - Renato
20	07/01/2021	Troca de ralo do banheiro da sala 802 do Edifício 77	Hidráulica	Reitoria	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Ricardo e Juan
21	07/01/2021	Troca de 4 Lâmpadas de LED no banheiro da Empresa Rio Minas	Elétrica	Valonguinho			Equipe: Ctesa - Rubens
22	07/01/2021	Troca de 4 tomadas no corredor do Prédio da Física	Elétrica	Valonguinho	P.V - Física		Equipe: Ctesa - Rubens e Vinicius
23	07/01/2021	Limpeza do telhado da Guarita do Barreto para retira de vazamento	Outros	Unidades Dispersas	CRIA		Equipe: Ctesa - Antonio e Nilmar
24	07/01/2021	Unificação de dois interruptores para apenas um interruptor na sala 406, do bl. M	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Eletricista Pablo






25	07/01/2021	Abertura de uma vala para instalação de uma tubulação de esgoto	Civil	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Salvador, Nilmar e Aldair
26	07/01/2021	Instalação da tubulação de esgoto ao lado da Biblioteca	Hidráulica	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Marcelo, Aldair, Salvador, Ualace, Adriano, Nilmar e Josino
27	07/01/2021	Troca de um interruptor na Guarita do Mequinho	Elétrica	Mequinho	Guarita		Equipe: Ctesa - Eletricista Thiago
28	07/01/2021	Troca de uma tomada de 10Ap para 20Ap, na sala 403, do bl. M	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Eletricista Pablo
29	08/01/2021	Retirada de água D3 poço do elevador do bl. O	Hidráulica	Gragoatá	GR - ICHF		Equipe: Ctesa - Pablo, Josino e Aldair
30	08/01/2021	Manutenção de solda nas grades lateral do estacionamento no valonguinho	Serralheria	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Jorge da Paixão, Helder Santiago e Oscar
31	08/01/2021	Troca de um sifão no tanque do DML no 4º andar	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Computação		Equipe: Ctesa - Wellington e Vinicius



32	08/01/2021	Instalação de um Nobreak na bl. C	Elétrica	Gragoatá	GR - COSEAC		Equipe: Ctesa - Pablo e Léo
33	08/01/2021	Conserto do telhado do Aquivo de jurujuba com ripa e telha.	Marcenaria	Unidades Dispersas	Arquivo		Equipe: Ctesa - Antonio, Nilmar, Salvador e Oscar
34	08 e 11/01/2021	Pintura no 5º andar do DCF	Pintura	Reitoria	RT - PROPLAN		Equipe: Ctesa - Abedias e Carlos Vita
35	08/01/2021	Pintura ao lado da Portaria do valonguinho	Pintura	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Mateus
36	10/01/2021	Revisão das Lâmpadas da parte externa da Paria Vermelha	Elétrica	Praia Vermelha	Área Externa		Equipe SOMA - Ademar, Rogério e Eng. Artur
37	11/01/2021	Troca de Luminárias no corredor em frente a sala do Consultório médico na Reitoria	Elétrica	Reitoria	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Ricardo e Pablo





38	11/01/2021	Colocação de suas tampas cegas redondas no Saguão da Reitoria	Elétrica	Reitoria	RT - Saguão		Equipe: Ctesa - Ricardo e Pablo
39	11 e 12/01/2021	Pintura da Guarita do Campus do Gragoatá	Pintura	Gragoatá	Guarita		Equipe: Ctesa - Adriano e Reginaldo
40	12/01/2020	Instalação de disjuntores individuais para ar condicionado na sala 409, bl. M	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Pablo
41	12/01/2020	Fechamento do Teto de gesso do banheiro do Consultório do Dr. José Carlos Edifício 77	Marcenaria	Unidades Dispersas	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Ricardo e Juan
42	12/01/2020	Limpeza do Calha no telhado do galpão do Barreto - CRIAA	Outros	Unidades Dispersas	CRIA		Equipe: Ctesa - Ricardo, Antonio e Oscar
43	12/01/2020	Verificação do contrapico de cimento, abaixo do carpete do protocolo da Reitoria	Civil	Reitoria	RT - Protocolo		Equipe: Ctesa - Léo

44	12 e 14/01/20 20	Retirada de reboco que estava despedregando e refeito um novo reboco, na parede externa da FAc. Veterinária	Civil	Unidades Dispersas	Veterinária		Equipe: Ctesa - Nilmar, Mateus, Josino, Aldair, Gilmar e Salvador
45	12 e 14/01/20 21	Pintura da Guarita do Campus do Gragoatá	Pintura	Gragoatá	Guarita		Equipe: Ctesa - Renaldo e Adriano
46	12/01/202 1	Pintura no laboratório do 4º andar no prédio da Odontologia	Pintura	Valonguin ho	VL - Odontologia		Equipe: Ctesa - Abedias e Carlos Vita
47	12/01/202 1	troca de uma torneira com vazamento no banheiro masculino do Mequinho	Hidráulica	Mequinho	MQ - Transporte		Equipe: Ctesa - Oscar
48	13/01/202 1	Transformado a bomba motora da botoeira de 220 para 380 na Reitoria	Elétrica	Reitoria	Área Extena		Equipe: Ctesa - Renato Dias e Milton Pontes
49	13/01/202 1	Pintura do Teto do banheiro do Consultório do Dr. José Carlos Edifício 77	Pintura	Reitoria	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Ricardo, Reginaldo, Adriano e carlos






50	13/01/2021	Restabelecimento de energia no 3º andar da Biblioteca Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Renato Dias e Milton Pontes
51	13/01/2021	Instalação de três portas no Inst. de Biologia	Marcenaria	Valonguinho			Equipe: Ctesa - Antonio e Helder
52	13/01/2021	Limpeza do Telhado do bl. E	Outros	Praia Vermelha	P.V - Engenharia		Equipe: Ctesa - Nilcinei de Souza, Carlos Henrique e Vinicius Gripp
53	13/01/2021	Conserto da tubulação no subsolo do bl. M e bombeamento de água que estava acumulada.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Marcelo e Mateus
54	13/01/2021	Troca de duas torneiras e retirada de vazamento no 4º andar do prédio da Antiga Matemática	Hidráulica	Valonguinho	VL - Administração e Ciências Contábeis		Equipe: Ctesa - Renato Dias e Milton Pontes

55	13/01/2021	Troca de uma tomada de 10Ap por uma de 20Ap, no 2º andar do prédio do Laboratório para a instalação de uma bebedouro	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Computação		Equipe: Ctesa - Lucas e Vinicius
56	14/01/2021	Retirada de curto circuito da Biblioteca Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Jorge da Paixão
57	14/01/2021	Troca de uma bomba de cisterna da Arquitetura, foi feita a verificação de parte elétrica e logo em seguida a instalação da bomba	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Arquitetura e Urbanismo		Equipe: Ctesa - Nilcinei, Wellington, Vinicius e Lucas
58	14/01/2021	Fechamento de dois buracos de ar condicionado no térreo da Biblioteca	Civil	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Ricardo, Antonio e Oscar
59	14/01/2021	Troca de oito lâmpadas de todos os andares nas salas da UTA bl.E	Elétrica	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Pablo e Mateus
60	14/01/2021	Instalação de uma porta no corredor entre as salas 405 e 406, no 4º andar do bl. M	Marcenaria	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Helder e Antonio

61	14/01/2021	Esvaziamento da Cisterna da Escola de Enfermagem o automático da bomba foi desarmado para evitar entrar ar, ao ligar.	Outros	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Jorge e Oscar
62	14 e 15/01/2021	Embolso de uma parte do beiral da Laje na fac. de Veterinária	Civil	Unidades Dispersas	Veterinária		Equipe: Ctesa - Josino, Salvador, Nilmar e Aldair
63	15/01/2021	Desmontagem do Andaime e retirada de entulho	Outros	Unidades Dispersas	Veterinária		Equipe: Ctesa - Nilmar e Aldair
64	15/01/2021	Conserto de uma torneira de Jardim na Física	Hidráulica	Gragoatá	GR - Educação Física		Equipe: Ctesa - Nilmar e Aldair
65	15/01/2021	Furação da parede para passagem de cabos que alimentaram as câmeras de segurança	Civil	Praia Vermelha	P.V - Geociências		Equipe: Ctesa - Wellington Pontes e Carlos Henrique






66	15/01/2021	Desentupimento de um ralo do banheiro feminino no 2º andar da Geoviécias	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Geociências		Equipe: Ctesa - Nilcinei e Vinícius
67	15/01/2021	Fechamento de um registro de entrada de água do prédio	Hidráulica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Renato Lima e Milton
68	15/01/2021	Troca de uma torneira de Laboratório no prédio do NAL	Hidráulica	Valonguinho	VL - NAL		Equipe: Ctesa - Milton Pontes
69	15/01/2021	Colocação de portas e painéis	Marcenaria	Valonguinho	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Atonio Magalhães
70	18/01/2021	Troca de 22 lâmpadas fluorescente de 20 para LED no corredor do 5º andar no prédio da Antiga Matemática	Elétrica	Valonguinho			Equipe: Ctesa - Ricardo, Lucas e Mateus
71	18, 19 e 22/01/2021	Serviço executado na rede elétrica do Mazzini Bueno	Elétrica	Valonguinho	VL - Mazzini Bueno		Equipe SOMA - Ademar, Rogério e Eng. Artur








72	18/01/2021	Retirada da água da Cisterna da Enfermagem	Outros	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Jorge e Oscar
73	18/01/2021	Fechamento com acrílico nas janelas onde estavam faltando os vidros na Biologia	Marcenaria	Valonguinho	VL - Química		Equipe: Ctesa - Antônio e Adriano
74	19/01/2021	Conserto com massa corrida na Biblioteca do Gragoatá	Civil	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Nilmar e Aldair
75	19/01/2021	Troca de uma torneira no Mequinho setor de Transporte	Hidráulica	Mequinho	MQ - Transporte		Equipe: Ctesa - Oscar
76	19/01/2021	Troca de uma boia no Mequinho setor de Transporte	Hidráulica	Mequinho	MQ - Transporte		Equipe: Ctesa - Oscar
77	19/01/2021	Manobra de água para abastecimento das caixas d'água do Valonguinho	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Marcelo e Pablo

78	<b>19 e 26/01/20 21</b>	Pintura das Grades atrás da Antiga Matemática - valonguinho	Pintura	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Carlos Vita e Matheus da Silva
79	19/01/2021	Instalação de tomada na Copa da empresa Rio Minas	Elétrica	Praia Vermelha			Equipe: Ctesa - Rubens
80	19/01/2021	Troca de Lâmpadas de LED na Copa da empresa Rio Minas	Elétrica	Praia Vermelha			Equipe: Ctesa - Rubens
81	19/01/2021	Troca de duas Lâmpadas de LED na banheiro feminino na Fíca Velha	Elétrica	Valonguinho			Equipe: Ctesa - Rubens
82	20/01/2021	Limpeza da Cisterna na Escola de Enfermagem	Outros	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Josino, Adair e Fábio
83	<b>20 e 21/01/20 21</b>	Conserto da rachadura entre a parede da Escola de Enfermagem e o prédio vizinho	Civil	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Salvador e Aldair / Josino, Savador e Aldair


84	20/01/2021	Fechamento da Coluna d'água com Drywall no 3º andar, sala 305 na Reitoria	Marcenaria	Reitoria	RT - PROPII		Equipe: Ctesa - Ricardo, Rdrigo, Matheus e Pablo
85	20 e 21/01/2021	Fechamento no teto de gesso com Drywall para receber pintura no consultório Médico	Marcenaria	Reitoria	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Ricardo, Reginaldo e Jorge
86	20/01/2021	Coserto com solda no portão do Gragoatá	Serralheria	Gragoatá	Área Externa		Equipe: Ctesa - Helder, Jorge e Adriano
87	20/01/2021	Pintura na parede da Biblioteca do Gragoatá	Pintura	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Reginaldo e Matheus
88	20/01/2021	Conserto na tubulação no Biomédico bl.A	Hidráulica	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Oscar e Antonio
89	20/01/2021	Montagem de um caixonete para ar condicionado na Guarita do Biomédico bl.A	Marcenaria	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Antonio

90	21/01/2021	Demolição da casa de bombas no valonguinho	Civil	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Ricardo, Rodrigo, Adriano e Matheus
91	21/01/2021	Feitos os testes de todas as luminárias solares em todo o Campus do Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	Área Externa		Equipe: Eng. Artur da SOMA, com apoio da empresa Ctesa
92	21/01/2021	Instalação do quadro com disjuntores e tomadas para funcionamento da máquina de gelo no bl. M, sala de lavagem e Esterelização	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa -
93	21/01/2021	Troca de um disjuntor da bomba d'água do bl. B	Elétrica	Gragoatá	GR - Letras		Equipe: Ctesa - Renato Dias e Marcelo Lima
94	21/01/2021	Fixação de duas aros e tampas da cisterna do prédio da Computação	Civil	Praia Vermelha	P.V - Computação		Equipe: Ctesa - Nilcinei, Vinicius e Wellington
95	22/01/2021	Troca de um sifão no laboratório do banheiro masculino do 2º andar da Geociências	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Geociências		Equipe: Ctesa - Nilcinei, Vinicius e Wellington

96	22/01/2021	Reparo no porte que fica de trás da moradia Edutantil	Elétrica	Gragoatá	GR - Moradia Estudantil		Equipe: Eng. Artur da SOMA/UFF com apoio da empresa Ctesa
97	22/01/2021	Troca de uma válvula no laboratório do banheiro masculino do 2º andar da Geociências	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Geociências		Equipe: Ctesa - Nilcinei, Vinicius e Wellington
98	25/01/2021	Troca de um vaso no Arquivo de Jurujuba	Hidráulica	Unidades Dispersas	Arquivo		Equipe: Ctesa - Oscar e Antonio
99	25/01/2021	Aumento da vazão de água que abastece o bl. M	Hidráulica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Ualace, Marcelo e Matheus
100	25/01/2021	Desmontagem de armário e prateleiras no Instituto de Física	Marcenaria	Valonguinho	VL - Química		Equipe: Ctesa - Oscar e Antonio
101	25/01/2021	Fechamento provisório do telhado no prédio do Mazzine Bueno	Marcenaria	Valonguinho	VL - Mazzini Bueno		Equipe: Ctesa - Aldair, Nilmar e Oscar



10 2	25/01/2021	Abertura de furos para instalar tubos para Drenar água no bl. O	Hidráulica	Gragoatá	GR - ICHF		Equipe: Ctesa - Nilmar, Salvador e Fabio
10 3	25/01/2021	ENEL presente na UFF do Valonguinho fazendo a avaliação do Transformador do Mazzini Bueno	Elétrica	Valonguinho	VL - Mazzini Bueno		Equipe: ENEL com apoio da SOMA/UFF Ademar, Rogério e Eng. Artur
10 4	25/01/2021	Troca de lâmpadas nos corredores da antiga Matemática no 2º andar Valonguinho	Elétrica	Valonguinho	VL - Administração e Ciências Contábeis		Equipe: Ctesa - Thiago Zacharias e Matheus da Silva
10 5	25/01/2021	Reparo no telhado da Creche.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Creche		Equipe: Ctesa - Rodrigo e Matheus da Silva
10 6	25/01/2021	Instalação de um chuveiro na portaria do Gragoata.	Hidráulica	Gragoatá	Guarita		Equipe: Ctesa - Marcelo Lima e Matheus da Silva
10 7	25/01/2021	Pintura no 5º andar da Fac. Nutrição.	Pintura	Valonguinho	VL - Nutrição		Equipe: Ctesa - Reginaldo Araujo, Abedias Silva e Carlos Vitta
10 8	25/01/2021	Desmontagem das divisórias no térreo da Geociências.	Outros	Praia Vermelha	P.V - Geociências		Equipe: Ctesa - Wellington Pontes, Nilcinei de Souza e Vinicius Gripp


109	25/01/2021	Conserto do telhado do Mazzine Bueno.	Marcenaria	Valonguinho	VL - Mazzini Bueno		Equipe: Ctesa - Antonio Magalhães, Adriano Jose e Matheus da Silva
110	26/01/2021	Retirada d'água que está infiltrado no poço dos três elevadores do bloco O, Gragoatá.	Hidráulica	Gragoatá	GR - História		Equipe: Ctesa - Marcelo Lima, Pablo dos Santos e Fabio Xavier
111	26/01/2021	Vistoria no telhado e na lage da casa de máquina na Faculdade de Enfermagem.	Marcenaria	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Antonio Magalhães
112	26/01/2021	Reparo na porta de divisória do auditório no 4º andar do bloco E.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Serviço Social		Equipe: Ctesa - Rodrigo, Helder da Silva e Adriano Jose
113	26/01/2021	Fechamento com muro na rua Andrade Neves, fundos Valonguinho onde foi demolido a casa de bomba	Civil	Valonguinho	VL - Química		Equipe: Ctesa - Salvador, Matheus da Silva
114	26/01/2021	Instalação de duas grades nas janelas para ar condicionado na secretaria e na sala ao lado, Mequinho.	Civil	Mequinho	MQ - Transporte		Equipe: Ctesa - Nilmar Elias e Fabio Xavier
115	26/01/2021	Troca de telhas na Faculdade de Enfermagem.	Marcenaria	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Antonio Magalhães e Adriano Jose


116	26/01/2021	Ligação provisória de uma bomba para esgotamento de 3 poços dos elevadores do bloco O.	Elétrica	Gragoatá	GR - História		Equipe: Ctesa - Pablo dos Santos
117	26/01/2021	Conserto de uma tubulação hidráulica que estava vazando.	Hidráulica	Gragoatá	GR - UFASA - A		Equipe: Ctesa - Marcelo Lima e Aldair de Souza
118	26/01/2021	Troca de lâmpadas no Mazzine Bueno.	Elétrica	Valonguinho	VL - Mazzini Bueno		Equipe: Ctesa - Thiago Zacharias
119	27/01/2021	Retirada de um vazamento no 5º andar do prédio da administração II.	Hidráulica	Valonguinho	VL - Administração e Ciências Contábeis		Equipe: Ctesa - Nilcibe de Souza e Vinocius Gripp
120	27/01/2021	Serviço de instalação da bomba para atender à cadeira de acessibilidade da piscina da Educação Física	Elétrica	Gragoatá	GR - Educação Física		Equipe Ctesa com apoio da Eng. Artur da SOMA/UFF
121	27/01/2021	Limpeza da laje da guarita do Biomédico bl. A	Outros	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Adair de Souza e Salvador Batista








12 2	27/01/2021	Abertura de um vão na alvenaria para instalação de um caixonete para ar condicionado.	Outros	Valunguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Adair de Souza e Salvador Batista
12 3	28/01/2021	Instalação de um caixonete para ar condicionado bl. A Guarita	Civil	Valunguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Adair de Souza e Salvador Batista
12 4	28/01/2021	Recomposição dos blocos intertravados do estacionamento bl. A Guarita	Civil	Valunguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Aldair de Souza e Salvador Batista
12 5	28/01/2021	Primeira remessa de bombas d'água reparadas e entregues na SOMA	Elétrica	Gragoatá	GR - SOMA		Equipe: Almoxarifado SOMA Luiz Augusto e Valter
12 6	28/01/2021	Concretagem de dois tubos de dreno dos poços dos elevadores no bloco O	Civil	Gragoatá	GR - História		Equipe: Ctesa - Nilmar Elias e Fabio Xavier
12 7	##### #	Quadro de energia desativado na Biomédica bloco A.	Elétrica	Valunguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Pablo dos Santos

128	28/01/2021	Técnicos da ENEL fazendo vistoria de média tensão cabine primaria do Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	Área Externa		Equipe: ENEL, com apoio da SOMA - Ademar, Rogério e Eng. Artur
129	28/01/2021	Troca de três tomadas para ligação de ar condicionado na Biblioteca Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Pablo dos Santos e Matheus da Silva
130	29/01/2021	Vistoria elétrica, com troca de lâmpadas e pequenos reparos nos circuitos de iluminação, em todos os andares dos blocos do Gragoatá.	Elétrica	Gragoatá	GR - Letras		Equipe: Ctesa - Lucas Batista, Pablo dos Santos e Matheus da Silva
131	29/01/2021	Vistoria hidráulica de todos os bebedouros e banheiros dos blocos do Gragoatá.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Letras		Equipe: Ctesa - Nilcinei e Vinicius Gripp
132	29/01/2021	Colocação de Insufilm no Laboratório do prof. Antonio Cláudio bl. E	Outros	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Serviço realizado pela empresa Ctesa
133	29/01/2021	Pintura do 5º andar da prédio da administração II.	Pintura	Valonguinho	VL - Administração e Ciências Contábeis		Equipe: Ctesa - Carlos Vita, Reginaldo de Araujo e Abedias Silva

134	29/01/2021	instalação de parafusos para prender as telhas do telhado da Escola de Enfermagem	Marcenaria	Unidades Dispersas	Enfermagem		Equipe: Ctesa - Antonio Magalhães e Adriano Jose
135	29/01/2021	Instalação do elevador da piscina da Educação Física	Elétrica	Gragoatá	GR - Educação Física		Equipe Ctesa com apoio da Eng. Artur da SOMA/UFF
136	29/01/2021	Reforma da rampa da homologia do valonguinho.	Civil	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Aldair de Souza e Salvador Batista
137	#####	Substituição de 34 lâmpadas de emergência nas escadas.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - UFASA - H		Equipe: Ctesa - Rubens Dias
138	29/01/2021	Troca de 4 lâmpadas de led no corredor do 3º andar.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - UFASA - H		Equipe: Ctesa - Rubens Dias
139	29/01/2021	Troca de um interropto de 2 seções no corredor do 3º andar.	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - UFASA - H		Equipe: Ctesa - Rubens Dias
<b>DMBI - SERVIÇOS EXECUTADOS - PLANTÃO MANUTENÇÃO</b>							

Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
140	08/01/2021	Iluminação na parte externa do Biomédico Novo	Elétrica	Valunginho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Jorge e Oscar
141	09/01/2021	Manobra de d'água para abastecer todos os prédios do Campus	Hidráulica	Valunginho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
142	11/01/2021	Manobra de d'água para abastecer todos os prédios do Campus	Hidráulica	Valunginho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
143	13/01/2021	Energia restabelecida no 3º andar da Biblioteca do Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
144	13/01/2021	Transformado a bomba motora da da botoeira de 220 para 380 na Reitoria	Elétrica	Reitoria	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
145	13/01/2021	Troca de 2 torneiras e retirada de um vazamento no 4º andar do prédio da Antiga Matemática	Hidráulica	Valunginho	VL - Administração e Ciências Contábeis		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias



146	13/01/2021	Separação de dois ares condicionado que estavam ligados em um mesmo disjuntor	Elétrica	Reitoria	RT - PROGER		Equipe: Ctesa - Renato Dias
147	14/01/2021	Troca das lâmpadas no bl. E, 5° andar e no hall dos Elevadores do Inst. Biomédico	Elétrica	Valonguinho	VL - Biomédico		Equipe: Ctesa - Jorge e Oscar
148	14/01/2021	Retirada de curto circuito na Biblioteca Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Ctesa - Jorge Paixão
149	15/01/2021	Troca de um tomada de 20A macho e fêmea no 6° andar na PROEX	Elétrica	Reitoria	RT - PROGER		Equipe: Ctesa - Renato Dias
150	15/01/2021	Instalação de disjuntor bipolar 20A para ar condicionado e troca de disjuntor geral tripolar de 40A na PROGER	Elétrica	Reitoria	RT - PROGER		Equipe: Ctesa - Renato Dias
151	15/01/2021	Troca de luminária com reator no corredor da PROEX da Reitoria.	Elétrica	Reitoria	RT - PROEX		Equipe: Ctesa - Renato Dias


15 2	15/01/2021	Troca de reator da luminária do corredor do plantão médico da Reitoria.	Elétrica	Reitoria	RT - Centro Médico		Equipe: Ctesa - Renato Dias
15 3	15/01/2021	Manobra d'água para abastecer todos os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes
15 4	15/01/2021	Fechamento do registro de entrada d'água do prédio no bl. M	Hidráulica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Nilcinei de Souza e Renato Dias
15 5	16/01/2021	Troca de uma descarga da Guarita	Hidráulica	Unidades Dispersas	GR - SDC		Equipe: Ctesa - Oscar de Souza e Jorge da Paixão
15 6	17/01/2021	Foi trocado 14 lâmpadas no corredor do segundo andar no bloco E.	Elétrica	Gragoatá	GR - Serviço Social		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
15 7	17/01/2021	Manobra d'água para abastecer todos os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes


158	17/01/2021	Retirada da entrada de ar na bomba que abastece o prédio no bl. N	Hidráulica	Gragoatá	GR - ICHF		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
159	17/01/2021	Esgotamento da caixa d'água do prédio do bl. M	Hidráulica	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
160	19/01/2021	Troca de 26 lâmpadas com troca de voltagem no Mazzine Bueno	Elétrica	Valonguinho	VL - Mazzini Bueno		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
161	19/01/2021	Manobra d'água para abastecer todos os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes
162	21/01/2021	Troca de disjuntor geral tripolar de 30A para um disjuntor tripolar de 40A da bomba de água do bloco B.	Elétrica	Gragoatá	GR - UFASA - A		Equipe: Ctesa - Renato Dias
163	21/01/2021	Manobra d'água para abastecer todos os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes

164	21/01/2021	Manobra d'água para abastecer todos os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
165	23/01/2021	Conserto de vazamento de água atrás do bandeirão.	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Restaurante		Equipe: Ctesa - Milton Pontes e Renato Dias
166	25/01/2021	Conserto do comando das bombas do hospital Veterinário.	Elétrica	Unidades Dispersas	Veterinária		Equipe: Ctesa - Renato Dias
167	25/01/2021	Manobra d'água para abastecer todos os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa		Equipe: Ctesa - Milton Pontes
<b>DMBI - SERVIÇOS EXECUTADOS - INTERIOR</b>							
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
168	04/01/2021	Retirada de um vazamento em um bebedouro na área externa.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira



169	04/01/2021	Troca de 2 válvulas de descarga e 2 sifões.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira
170	05/01/2021	Retirada de um quadro para pintura das grades.	Pintura	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
171	07/01/2021	Conserto do roboco no muro da Guadra	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
172	08/01/2021	Confecção de uma rampa de acesso ao anfiteatro.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
173	07 e 08/01/2021	Pintura da fachada da unidade de Rio das Ostras	Pintura	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Mão de obra em parceria com a prefeitura
174	07/01/2021	Entrega de materias para pintura	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: CMA/SOMA/UFF

175	11/01/2021	Conserto de uma descarga do banheiro masculino.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira
176	11, 12 e 13/01/2021	Pintura da fachada na Unidade de Rio das Ostras	Pintura	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Mão de obra em parceria com a prefeitura de Rio das Ostras - Prefeito Marcelino, sob fiscalização da SOMA/UFF
177	11/01/2021	Retirada de um curto circuito e troca da fiação para restabelecimento da energia.	Elétrica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Robson Vidal
178	12/01/2021	Troca de um registro na área externa.	Elétrica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira
179	12/01/2021	Arremate e finalização da rampa de acesso aos containers.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
180	13/01/2021	Concretagem de um poste na área externa do Campus.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas

18 1	14/01/2021	Manobra d'água para abastecer os prédios do Campus.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira
18 2	14/01/2021	Limpeza das caixas de passagem do Campus.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira
18 3	19/01/2021	Início da concretagem para criação de uma calçada no portão de garagem.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas, Jose Mareira e Robson Vidal
18 4	20/01/2021	Concretagem para criação de uma calçada no portão de garagem.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas, Jose Mareira e Robson Vidal
18 5	21/01/2021	Serviço de recolocação de uma porta na moradia estudantil.	Civil	Rio das Ostras	R.O - Moradia Estudantil		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas, Jose Mareira e Robson Vidal
18 6	22/01/2021	Troca de um joelho e instalação de uma torneira no pátio.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas e Jose Mareira

187	22/01/2021	Finalização e arremate da colocação da porta na entrada da moradia estudantil.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre e Robson Vidal
188	25/01/2021	Foi aumentado o nível do portão para o nível do contra piso.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre e Robson Vidal
189	26/01/2021	Montagem de um chuveiro lava olhos.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
190	26/01/2021	Instalação de 2 portas cadeados.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
191	26/01/2021	Instalação de suportes para álcool gel.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
192	27/01/2021	Instalação de saboneteiras nos banheiros.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas e Jose Moreira





193	28/01/2021	Retirado 15 quadros da parede e afastando os moveis da parede do primeiro piso. Ajudando o pessoal da pintura.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
194	28/01/2021	Retirado 11 quadros da parede e afastando os moveis da parede do segundo piso. Ajudando o pessoal da pintura.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
195	29/01/2021	Instalação de suportes para alcool gel.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre de Freitas
196	06/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 03 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
197	07/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 01 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
198	07/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 01 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun

199	07/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 02 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
200	08/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 04 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
201	14/01/2021	Retirada de um curto circuito.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
202	15/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 05 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
203	18/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 03 para demolição do mesmo.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
204	19/01/2021	Desligamento do circuito do bloco 03 para demolição do mesmo Pédio IV	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun


205	19/01/2021	Retirada e desmontagem do quadro de luz do prédio III	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
206	20/01/2021	Continuação da retirada e desmontagem dos quadro de luz do prédio	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
207	21/01/2021	Reaperto dos disjuntores no quadro principal na portaria	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
208	25/01/2021	Instalação de uma tomada de 10A.portaria	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
209	26/01/2021	Conserto de um circuito de iluminação da portaria principal.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
210	27/01/2021	Troca de um interruptor na cozinha.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun

21 1	28/01/2021	Troca de um disjuntor de 32A que alimenta um circuito de tomadas no casarão.	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
21 2	29/01/2021	Troca de uma tomada de 10A na Administração	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro		Equipe: Ctesa - Noberto Braun
21 3	21/01/2021	Instalação de suportes para papel toalha e saboneteiras.	Civil	Nova Friburgo	N.F - ISNF		Equipe: Ctesa - Jse Antenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
21 4	22/01/2021	Instalação de suportes para papel toalha e saboneteiras, nos banheiros.	Civil	Nova Friburgo	N.F - ISNF		Equipe: Ctesa - Jse Antenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
21 5	25/01/2021	Instalação de suportes para papel toalha e saboneteiras, nos banheiros.	Civil	Angra dos Reis	N.F - ISNF		Equipe: Ctesa - Jse Antenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
21 6	26/01/2021	Instalação de suportes para papel toalha e saboneteiras, nos banheiros.	Civil	Angra dos Reis	N.F - ISNF		Equipe: Ctesa - Jse Antenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves



217	07/01/2021	Vistoria no serviço de recuperação do Telhado da Antiga Estação Ferroviária na Unidade de Campos	Civil	Campos dos Goytacazes	C.G - XV de Novembro		Equipe: Empresa Alves Estrutura e Serviços - sob fiscalização da SOMA/UFF
218	13/01/2021	Serviço de Alvenaria interna sendo demolidas e retirada de entulhos na Antiga Estação Ferroviária na Unidade de Campos	Civil	Campos dos Goytacazes	C.G - XV de Novembro		Equipe: Empresa Alves Estrutura e Serviços, com apoio da empresa Ctesa - sob fiscalização da SOMA/UFF
219	14/01/2021	Obra de pavimentação sendo iniciada	Civil	Campos dos Goytacazes	C.G - XV de Novembro		Equipe: Empresa Alves Estrutura e Serviços - sob fiscalização da SOMA/UFF
220	13/01/2021	Serviço de pintura da fachada na Unidade de Petrópolis	Pintura	Petrópolis	PT - Esc. de Engenharia		Equipe: Empresa Cimina - sob fiscalização da SOMA/UFF
221	20/01/2021	Confecção do calçamento do bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel
222	21/01/2021	Continuação do calçamento do bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel







22 3	22/01/202 1	Troca dos anéis de borracha da pia.	Hidráulica	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Jamerson Vieira e Israel
22 4	22/01/202 1	Reparo no circuito de iluminação dos refletores externos do prédio.	Elétrica	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Carlos Alexandre e Israel
22 5	22/01/202 1	Reparo nas paredes da sala técnica dos containers.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel
22 6	25/01/202 1	Continuação do calçamento do bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel
22 7	26/01/202 1	Continuação do calçamento do bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel
22 8	27/01/202 1	Continuação do calçamento do bicicletário e início da confecção da base para o bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel





229	28/01/2021	Continuação do calçamento do bicicletário e ida confecção da base para o bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel
230	29/01/2021	Continuação do calçamento do bicicletário e ida confecção da base para o bicicletário.	Civil	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES		Equipe: Ctesa - Diel Ramos e Israel
231	21/01/2021	Conserto do telhado de Volta Redonda Vila	Marcenaria	Volta Redonda	V.R - Vila		
<b>DMBI - SERVIÇOS RETROATIVOS MÊS DEZEMBRO - INTERIOR</b>							
232	01/12/2021	Continuação da pintura das sala de aula.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas
233	02/12/2021	Término da pintura da sala de aula.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas

23 4	02/12/202 1	Desmontagem da sala da professora Katia.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
23 5	02/12/202 1	Preparação das paredes do corredor para posterior pintura.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
23 6	03/012/20 21	Pintura do hall de entrada da universidade.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
23 7	04/12/202 1	Preparação das paredes para posterior pintura.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
23 8	04/12/202 1	Instalação de 6 suportes de sabonete liquido nas paredes do banheiro.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
23 9	04/12/202 1	Finalização do reparo no reboco da parte interna do muro do IHS.	Civil	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose






240	07/12/2021	Continuação da pintura do hall de entrada.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
241	08/12/2021	Continuação da pintura do hall de entrada.	Outros	Angra dos Reis	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
242	09/12/2021	Finalização da pintura do hall de entrada.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas, Jose Moreira e Robson Jose
243	10/12/2021	Manutenção na caixa d'água do vestiário.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas e Jose Moreira
244	11/012/2021	Preparação das portas para posterior aplicação de verniz.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas e Jose Moreira
245	15/12/2021	Troca de um sifão no banheiro masculino do 2º andar do ICT.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Jose Moreira







24 6	15/12/2021	Abertura de uma vala para passagem de uma tubulação hidráulica.	Civil	Angra dos Reis	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas e Jose Moreira
24 7	15/12/2021	Confecção de um ramal hidráulico para servir de dreno para um ar condicionado.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas e Jose Moreira
24 8	15/12/2021	Instalação de quadros negros nas salas.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas , Jose Moreira e Robson Jose
24 9	16/12/2021	Primeira demão de verniz no portão de acesso a rua 1º de maio.	Outros	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas
25 0	22/12/2021	Troca de duas cupas de pia.	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS		Equipe: Ctesa - Alexandre Freitas , Jose Moreira e Robson Jose
<b>DMBM - SERVIÇOS EXECUTADOS - NITERÓI</b>							
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL

25 1	04, 05 e 06/01/202 1	Limpeza da cobertura ao 5º andar do prédio do Instituto de Química	Aux. de Almoxarifad o	Praia Vermelha	P.V - Química (obra)		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
25 2	06/01/202 1	Retirada de Gramas e Galhos da área externa do prédio do Instituto de Química	Aux. de Almoxarifad o	Praia Vermelha	P.V - Química (obra)		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
25 3	07/01/202 1	Retirada de madeiras na parte interna do prédio do Instituto de Química	Aux. de Almoxarifad o	Praia Vermelha	P.V - Química (obra)		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
25 4	07/01/202 1	Serviços internos no Almoxarifado Central	Aux. de Almoxarifad o	Mequinho	MQ - Almoxarifad o PROAD		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
25 5	07/01/202 1	Retirada de Sucatas	Aux. de Almoxarifad o	Praia Vermelha	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
25 6	07 e 14/01/20 21	Retirada de Gramas do Campus do Gragoatá	Aux. de Almoxarifad o	Gragoatá	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
25 7	11 e 12/01/202 1	Pintura do meio fio do Campus do Gragoatá	Aux. de Almoxarifad o	Gragoatá	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS, com apoio da equipe Ctesa

258	12/01/2021	Retirada de Sucatas	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
259	13/01/2021	Limpeza e retirada de inservíveis dos Containes que ficam localizados em frente ao Instituto de Biologia	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS com apoio da empresa de limpeza Rio Minas, sob supervisão da DMBM/SOMA
260	13/01/2021	Limpeza e remoção de inservíveis e colocação de portas com cadeados de algumas salas no Térreo do Inst. de Biologia	Aux. de Almoarifado	Valonguinho			Equipe: SWAT da empresa CNS, com apoio da empresa Ctesa, sob supervisão da DMBM/SOMA
261	14/01/2021	Retirada de Estante do NAL, bl. P para o Inst. de Biologia bl. M	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	VL - NAL		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
262	15/01/2021	Limpeza e arrumação no Pilotis do bl. O no Compus do Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - ICHF		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
263	16/01/2021	Aplicação Fumacê para combater os mosquitos no Campus do Gragoatá	Desinsetização	Gragoatá	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA













264	18 e 19/01/2021	Retirada dos materiais inservíveis do novo prédio da Fac. de Medicina	Aux. de Almoarifado	Unidades Dispersas	Medicina		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
265	19/01/2021	Entrega de equipamentos saindos do Almoarifado do Mequinho para as seguintes unidades da UFF: Valonguinho - Química, STI, Odontologia, Mazzini Bueno, Estudo Estratégico e Administração I	Aux. de Almoarifado	Valonguinho			Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
266	20 e 21/01/2021	Serviços interno na biblioteca do Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
267	21/01/2021	Mivimentação de mobiliário inservíveis no Prédio do IACS II	Aux. de Jardinagem	Unidades Dispersas	IACS		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
268	22/01/2021	Transporte de papel Toalha do Mequinho para o Bl. E no Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - Serviço Social		Equipe: SWAT da empresa CNS, com apoio do motorista da empresa ORBENK sob fiscalização da DMBM/SOMA





269	22/01/2021	Transporte de materiais da Antiga Biologia no Valonguinho para o bl. M no Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: SWAT da empresa CNS, com apoio do motorista da empresa ORBENK sob fiscalização da DMBM/SOMA
270	22/01/2021	Retiradas de galhos do Campus do Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	Área Externa		Equipe: SWAT da empresa CNS, com apoio do motorista da empresa ORBENK sob fiscalização da DMBM/SOMA
271	25 e 26/01/2021	Serviços de separação e retirada das pedras nos fundos da Creche	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - Creche		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
272	26/01/2021	Entrega de material do Almoarifado Patrimônio Mequinho para o campus do Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Unidades Dispersas	GR - Letras		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
273	26/01/2021	Retirada de madeiras e sucatas no Valonguinho	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	Área Externa		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
274	26/01/2021	Retirada de Galhos da Praia Vermelha	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	Área Externa		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA






275	27/01/2021	Serviços internos no STI	Aux. de Almoarifado	Valonguinho			Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
276	27/01/2021	Retirada de madeiras e sucatas no Paria Vermelha	Aux. de Almoarifado	Praia Vermelha	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
277	27/01/2021	Serviços internos no Almoarifado Central	Aux. de Almoarifado	Mequinho	MQ - Almoarifado EDUFF		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
278	29/01/2021	Serviços internos no Almoarifado da SOMA	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - SOMA		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
279	29/01/2021	Dedetização em todas as unidades interna e externa do Campus do Gragoatá	Desinsetização	Gragoatá	Área Extena		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
280	29/01/2021	Limpeza na Fac. de Nutrição e Odontologia	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	VL - Nutrição		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA

28 1	29/01/2021	Limpeza na Fac. de Odontologia	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	VL - Odontologia		Equipe: SWAT da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
<b>DMBM - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - NITERÓI</b>							
28 2	04/01/2021	Poda de 07 árvores na UFF de Campos dos Goytacazes	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Área Extensa		Empresa Prestax trade Service sob supervisão da DMBM/SOMA
28 3	04, 05 e 06/01/2021	Serviços de Roçada em toda área do Campus do Gragoatá	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Área Extensa		Empresa Prestax trade Service sob supervisão da DMBM/SOMA
28 4	07 e 14/01/2021	Serviço de Roçada em toda a parte externa do COLUNI	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	COLUNI		Equipe: Jardinagem da empresa CNS, sob supervisão da DMBM/SOMA
28 5	04, 05 e 06/01/2021	Limpeza de roçada em toda área externa do prédio do Instituto de Química	Aux. de Jardinagem	Praia Vermelha	P.V - Química (obra)		Equipe de jardim da empresa CNS sob fiscalização da DMBM/SOMA
28 6	13/01/2021	Poda de galhos caídos na passagem da Ronda dos Vigias no Campus do Gragoatá	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Área Extensa		Equipe: Jardinagem da empresa CNS, sob supervisão da DMBM/SOMA

287	15/01/2021	Limpeza e Jardim e retirada e galhos e folhas do Compus do Garagoatá	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Área Extena		Equipe: Jardinagem da empresa CNS, sob supervisão da DMBM/SOMA
288	21/01/2021	Serviço de roçada na saída de emergencia ao lado da CRECHE	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	GR - Creche		Equipe: Jardinagem da empresa CNS, sob supervisão da DMBM/SOMA
<b>DMBM - SERVIÇOS REFRIGERAÇÃO - NITERÓI</b>							
289	04/01/2021	Manutenção do ar condicionado do setor da SOMA que estva pingando água no lado se dentro da sala	Refrigeração	Gragoatá	GR - SOMA		Empresa EPODONTO sob a supervisão técnica da DMBM/SOMA
290	07/01/2021	Instalação de Split na guarita do Gragoatá	Refrigeração	Gragoatá	Guarita		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
291	07/01/2021	Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ares condicionado do COLUNI	Refrigeração	Gragoatá	COLUNI		Equipe: Empresa EPODONTO e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
292	07/01/2021	Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ares condicionado da CRECHE	Refrigeração	Gragoatá	GR - Creche		Equipe: Empresa EPODONTO e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
293	08/01/2021	Mnautenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado do Instituto de Educação Física	Refrigeração	Gragoatá	GR - Educação Física		Equipe: Empresa EPODONTO e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA

294	12/01/2021	Retirada do ar condicionado da Biblioteca para manutenção	Refrigeração	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
295	12/01/2021	Manutenção corretiva do Split do 4º andar da sala da Direção (Fabiano)	Refrigeração	Reitoria	RT - PROGEP		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
296	13/01/2021	Manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos Containes que ficam localizados em frente ao Instituto de Biologia	Refrigeração	Valunginho	Área Externa		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
297	13/01/2021	Desinstalação e reinstalação do bebedouro da Fac. Farmácia	Refrigeração	Unidades Dispersas	Farmácia		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pela DMBM/SOMA
298	14/01/2021	Conserto do Chiller no Inst. Biomédico bl. E	Refrigeração	Valunginho	VL - Biomédico		Equipe: Técnicos de refrigeração DMBM/SOMA/UFF
299	14/01/2021	Recuperação do Split de 60.000 BTU's na sala segura do STI	Refrigeração	Valunginho			Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
300	21/01/2021	Manutenção dos aparelhos de ar condicionado na Fac. de Medicina onde estão sendo aplicadas as vacinas nos professores de saúde do HUAP.	Refrigeração	Unidades Dispersas	Medicina		Equipe: Empresa EPODONTO e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA

30 1	22/01/202 1	Manutenção do bebedouro da empresa Ctesa	Refrigeração	Gragoatá	Área Externa		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração da DMBM/SOMA
30 2	27/01/202 1	Instalação de Split no Hospital Veterinário	Refrigeração	Unidades Dispersas	Veterinária		Equipe: Mecânicos de refrigeração da empresa Ctesa e supervisionado pelo Técnico de Refrigeração Carpinelli da DMBM/SOMA
<b>DMBM - SERVIÇOS EXTINTORES - NITERÓI</b>							
30 3	11/01/202 1	Bloco A - UFASA (campus gragoatá) - Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - UFASA - A		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA
30 4	11/01/202 1	Bloco C - Instituto de Letras - Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Letras		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA
30 5	11/01/202 1	Bloco D - Faculdade de Educação - Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Educação		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA
30 6	11/01/202 1	Moradia estudantil - Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Moradia Estudantil		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA
30 7	13/01/202 1	Campus Volta Redonda (Aterrado e Vila) - Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	Área Externa		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA

308	29/01/2021	Bloco E - Escola de Serviço Social - Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Serviço Social		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA
309	29/01/2021	Bloco F - Faculdade de Economia - Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Economia		Equipe: Empresa Marvin Extintore, sob supervisão da Técnica de Segurança do trabalho SOMA
<b>DMBM - SERVIÇOS RESERVATÓRIOS - NITERÓI</b>							
310	13/01/2021	Biblioteca Central do Gragoatá - Limpeza de caixa d'água	Reservatórios	Gragoatá	GR - BCG		Equipe: Empresa Interágua, sob supervisão da fiscal do contrato/SOMA
311	18/01/2021	Bloco M - Instituto de Biologia (campus do gragoatá) - Limpeza de caixa d'água e cisterna	Reservatórios	Gragoatá	GR - Biologia		Equipe: Empresa Interágua, sob supervisão da fiscal do contrato/SOMA
<b>DMBM - SERVIÇOS ELEVADORES - NITERÓI</b>							
312	21/01/2021	Troca da placa do botão do 3º elevador do 5º andar no bl. N	Elevadores	Gragoatá	GR - Psicologia		Equipe: empresa EGS Elevadores



## 2. Coordenação de Transporte, Segurança e Logística – CTSL/SOMA

### 2.8 Divisão de Transporte – DTR

#### 2.8.1 Solicitações de Transporte e Logística executadas

- ✓ Suporte logístico às ações do Restaurante Universitário na distribuição de alimentos para as Moradias Estudantis;
- ✓ Apoio Logístico aos Almojarifados;
- ✓ Apoio logístico ao Instituto de Química para produção de nitrogênio líquido junto ao CRIOUFF;
- ✓ Apoio nas ações de testagem institucional de servidores em trabalho presencial;
- ✓ Apoio ao concurso realizado pela COSEAC;
- ✓ Suporte às ações do CAP/SAEP na movimentação de bens;
- ✓ Suporte às ações do STI;
- ✓ Continuação do processo de aferição dos tacógrafos das viaturas;
- ✓ Regularização das viaturas com a emissão dos CRLV'S de toda frota 2021;
- ✓ Organização dos veículos inservíveis e sucatas para Leilão;
- ✓ Apoio logístico ao HUAP com o transporte de Nitrogênio Líquido;
- ✓ Suporte as ações da DCF com auxílio do TaxiGov;
- ✓ Apoio logístico ao Gabinete do Reitor;
- ✓ Manutenção geral e contínua das Viaturas.

#### 2.8.1.1 Atendimentos da Divisão de Transporte

Janeiro 2021	
Administrativo	59
Distribuição de Bens	28
Diversos	8
<b>Total</b>	<b>95</b>

#### 2.8.2 Manutenção das viaturas transferidas da Polícia Federal para a UFF



### 2.8.3 Organização dos veículos inservíveis e sucatas para Leilão



## 2.9 Divisão de Segurança e Logística – DSL

### 2.9.1 Principais ações

- ✓ Autorização de entrada de pessoas nos campi;
- ✓ Controle de acesso de pessoas e veículos nos campi;
- ✓ Apoio de porteiros e zeladores para serviços de manutenção programada de elevadores;
- ✓ Informações de intercorrências nos prédios, tais como: luzes acesas, portas e janelas abertas, falha nos alarmes, ar-condicionado ligados, entre outros;

### 2.9.2 Quantitativo de postos de vigilantes por região

Rótulos de Linha	ARMADO	DESARMADO	TOTAL
INTERIOR	24	14	38
NITERÓI	44	14	58
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>96</b>

### 2.9.3 Quantitativo de postos de vigilantes por função

PREVISTO X REAL					
Contagem de CONDIÇÃO	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	ARMADO	DESARMADO	TOTAL	PREVISTO	SALDO
VIGILANTE NOTURNO 12X36	23	23	46	54	8
SUPERVISÃO DIURNO 12X36		2	2	2	0
SUPERVISÃO NOTURNO 12X36		2	2	2	0
VIGILANTE DIURNO 12x36	22		22	22	0
VIGILANTE MOTO DIURNO 12X36	12		12	12	0
VIGILANTE MOTO NOTURNO 12X36	11	1	12	12	0
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>8</b>

### 2.9.4 Quantitativo de postos de vigilantes por campi

Rótulos de Linha	QUANTIDADE
ANGRA DOS REIS - IEAR	2
ANGRA DOS REIS - RETIRO	2
CAMPOS - CENTRO	4
CAMPOS - XV NOVEMBRO	4
FAC. DIREITO	2
FAC. ENFERMAGEM	2
FAC. FARMÁCIA	2
FAC. VETERINÁRIA	2
FAZENDA ESCOLA VET.	4
GRAGOATÁ	14
IACS	4
IGUABA GRANDE	4
MACAÉ	4
MEQUINHO	4
PETRÓPOLIS	2
PRAIA VERMELHA	12
REITORIA	4
RIO DAS OSTRAS	4
STO ANTONIO DE PADUA	2
VALONGUINHO	12
VOLTA REDONDA	2
VOLTA REDONDA - ATERRADO	4
<b>Total Geral</b>	<b>96</b>

postos de vigilantes
